



LINEO 9 – L'UNION

ORGANISATION DE CHANTIER

Mise à jour 30/01/2018



ORGANISATION GÉNÉRALE DES TRAVAUX DE VOIRIE



Phase 4 – carrefour
route de Bessières
Mai – août 2018

Phase 1 – Montée de l'Union
Oct 17 – mars 18

Phase 3 – Centre
commercial Saint-Caprais
février – mai 2018

Travaux concessionnaires rue
Hortensias à partir février
2018 (hors projet LINEO)

Phase 2 – rue du
Somport
Février - avril 2018

NB : des travaux préalables ponctuels sont anticipés par les concessionnaires réseaux


PHASE 1: MONTÉE DE L'UNION



Carrefour route de Bessières / route de Bayonne
Direction Toulouse



Base de vie chantier LINEO 9

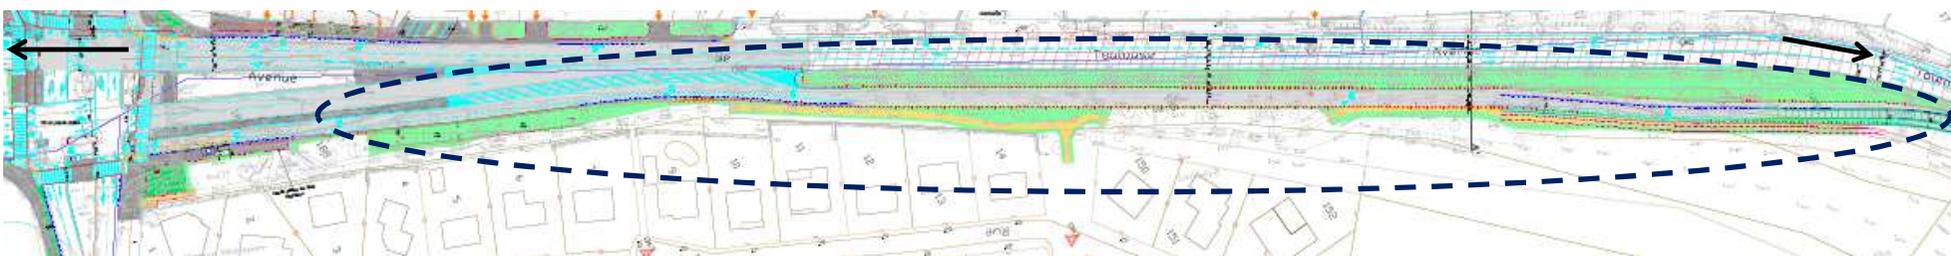


Printemps 2018 :

- Réalisation couche de roulement de la voie bus en site propre
 - Modelage et plantation des espaces verts
 - Modernisation de l'éclairage public avenue de Toulouse
- *Impact : pas d'impact sur la circulation des cheminements piétons*

PHASE 2: RUE DU SOMPORT

du 05/02/2018 au 27/04/2018

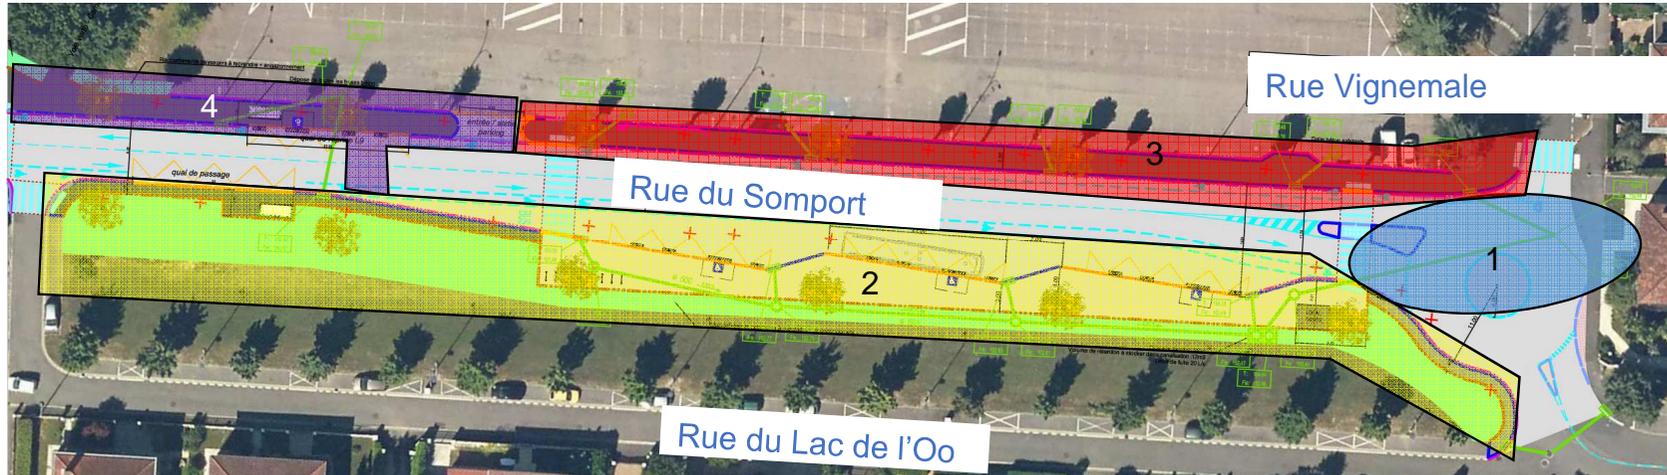

Travaux préparatoires : abattage des arbres, ces arbres seront remplacés par de nouvelles plantations d'alignements (chênes pédonculés)

1 Du 05/02/2018 au 13/02/2018 : Giratoire Somport / Vignemale – Réseaux pluvial de surface.
Impact : fermeture de la rue Vignemale. Accès rue Vignemale par le parking de la Halle l'Union

2 Du 14/02/18 au 16/03/18 : Réalisation voie bus et quais LINEO sur l'espace vert
Maintien rue du Somport à double sens de circulation

3 Du 19/03/18 au 30/03/18 : Réalisation trottoir côté Halle avec maintien double sens de circulation rue du Somport


4 Du 02/04/18 au 13/04/18 : Réalisation trottoir et quai bus côté Nord, avec alternat sur la rue du Somport

Du 16/04/18 au 20/04/18 (vacances scolaires) : Rabotage et enrobés de chaussée rue du Somport, travaux de jour.
Impact : fermeture de la rue du Somport. Mise en place itinéraire déviation pour accès rue Vignemale et rue du Lac de l'OO. Bus TISSEO déviés.

Automne 2018 : plantation des arbres d'alignements

PHASE 3: CENTRE COMMERCIAL

du 19/02/2018 au 02/03/2018

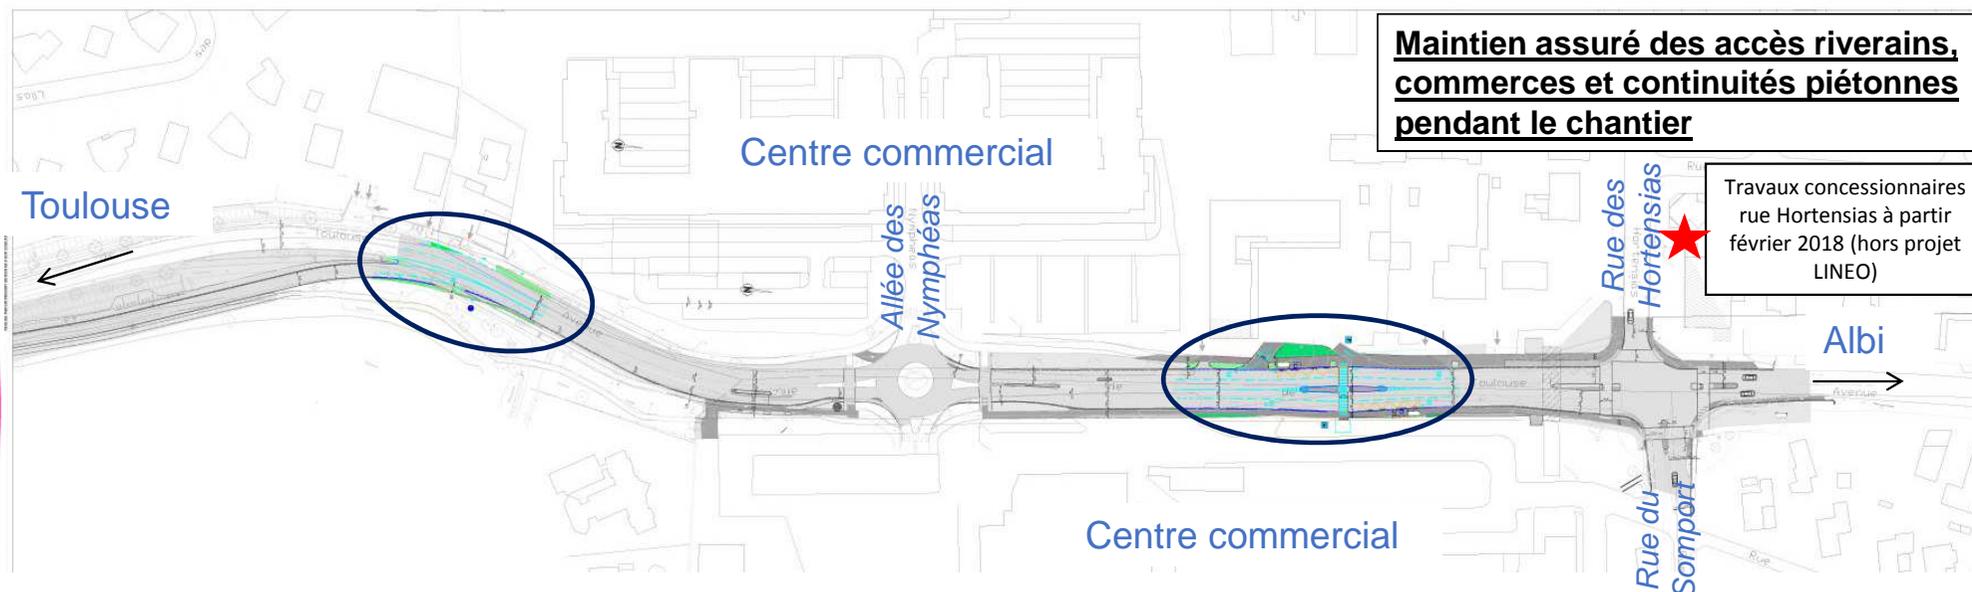


Phase 3.1 : du 19/02/2018 au 02/03/2018 (vacances scolaires)

Démolition des ilots existants, travaux d'assainissement (eaux pluviales) sur chaussée

Impact : Alternat en journée, réouverture à la circulation en dehors des horaires de travaux

PHASE 3: CENTRE COMMERCIAL

du 05/03/2018 au 01/06/2018

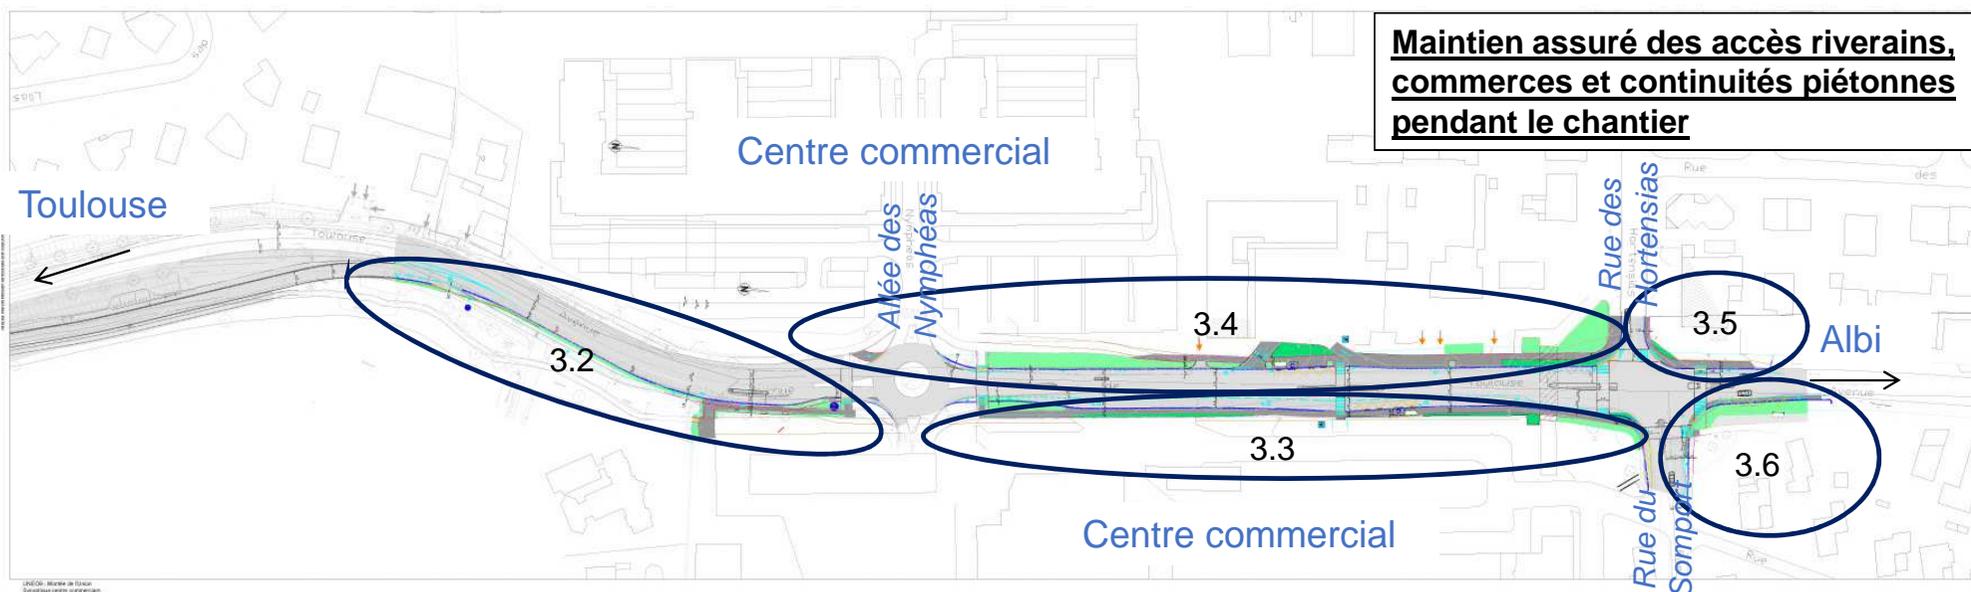


Phases 3.2 à 3.6 : du 05/03/2018 au 01/06/2018

Travaux d'assainissement (eaux pluviales de surface), création de trottoirs, voie bus, équipement carrefour à feu avenue de Toulouse / Hortensias / Somport, éclairage public.

Impact : maintien du double sens circulation sur l'Avenue de Toulouse

PHASE 3: CENTRE COMMERCIAL du 04/06/2018 au 13/06/2018

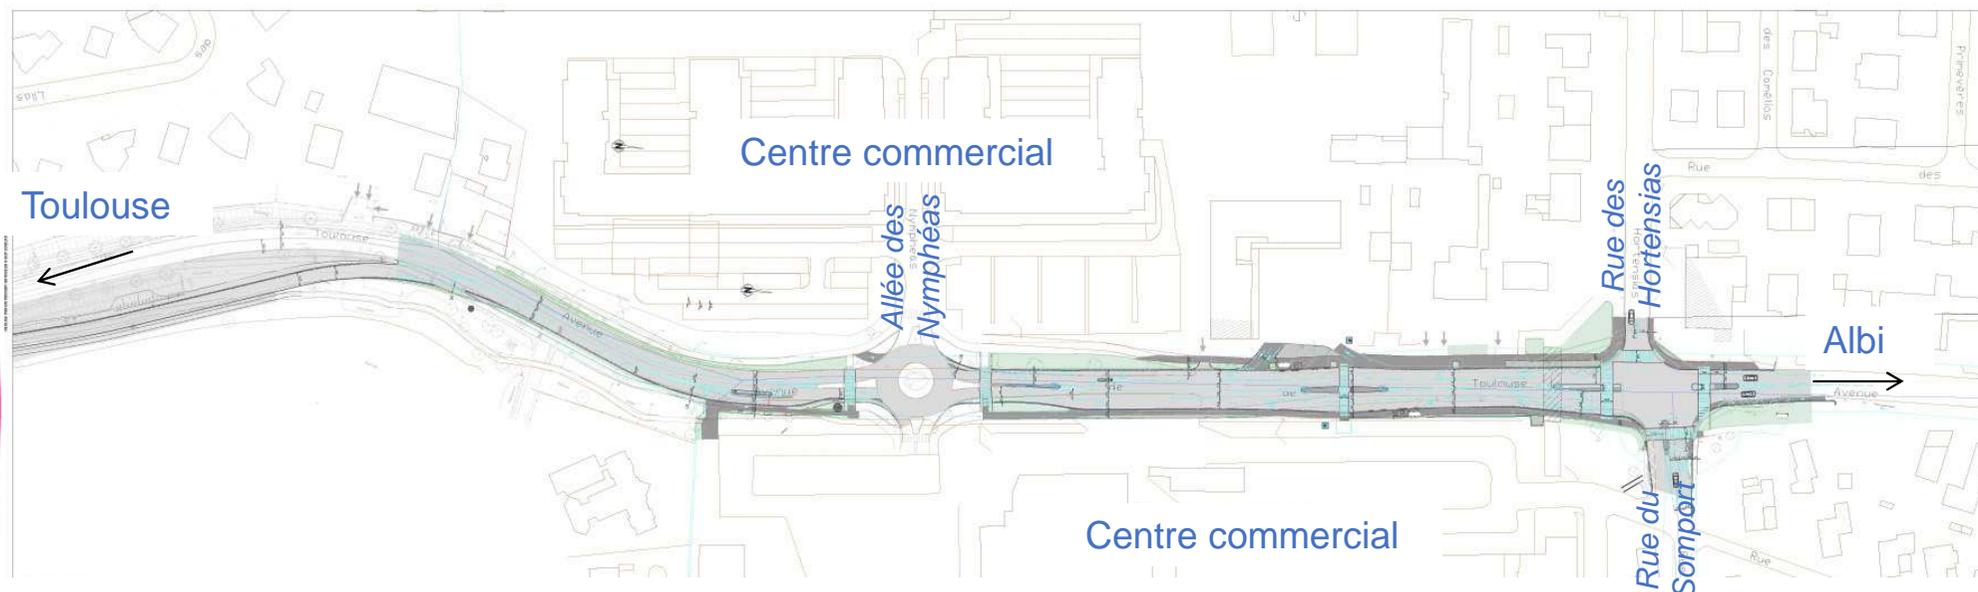


Phase 3.7 : du 04/06/2018 au 13/06/2018

Rabotage chaussée avenue de Toulouse, réalisation des îlots directionnels, revêtement de chaussée, signalisation

Impact : Fermeture de l'avenue de Toulouse à la circulation avec mise en place d'une déviation.

Travaux de nuit

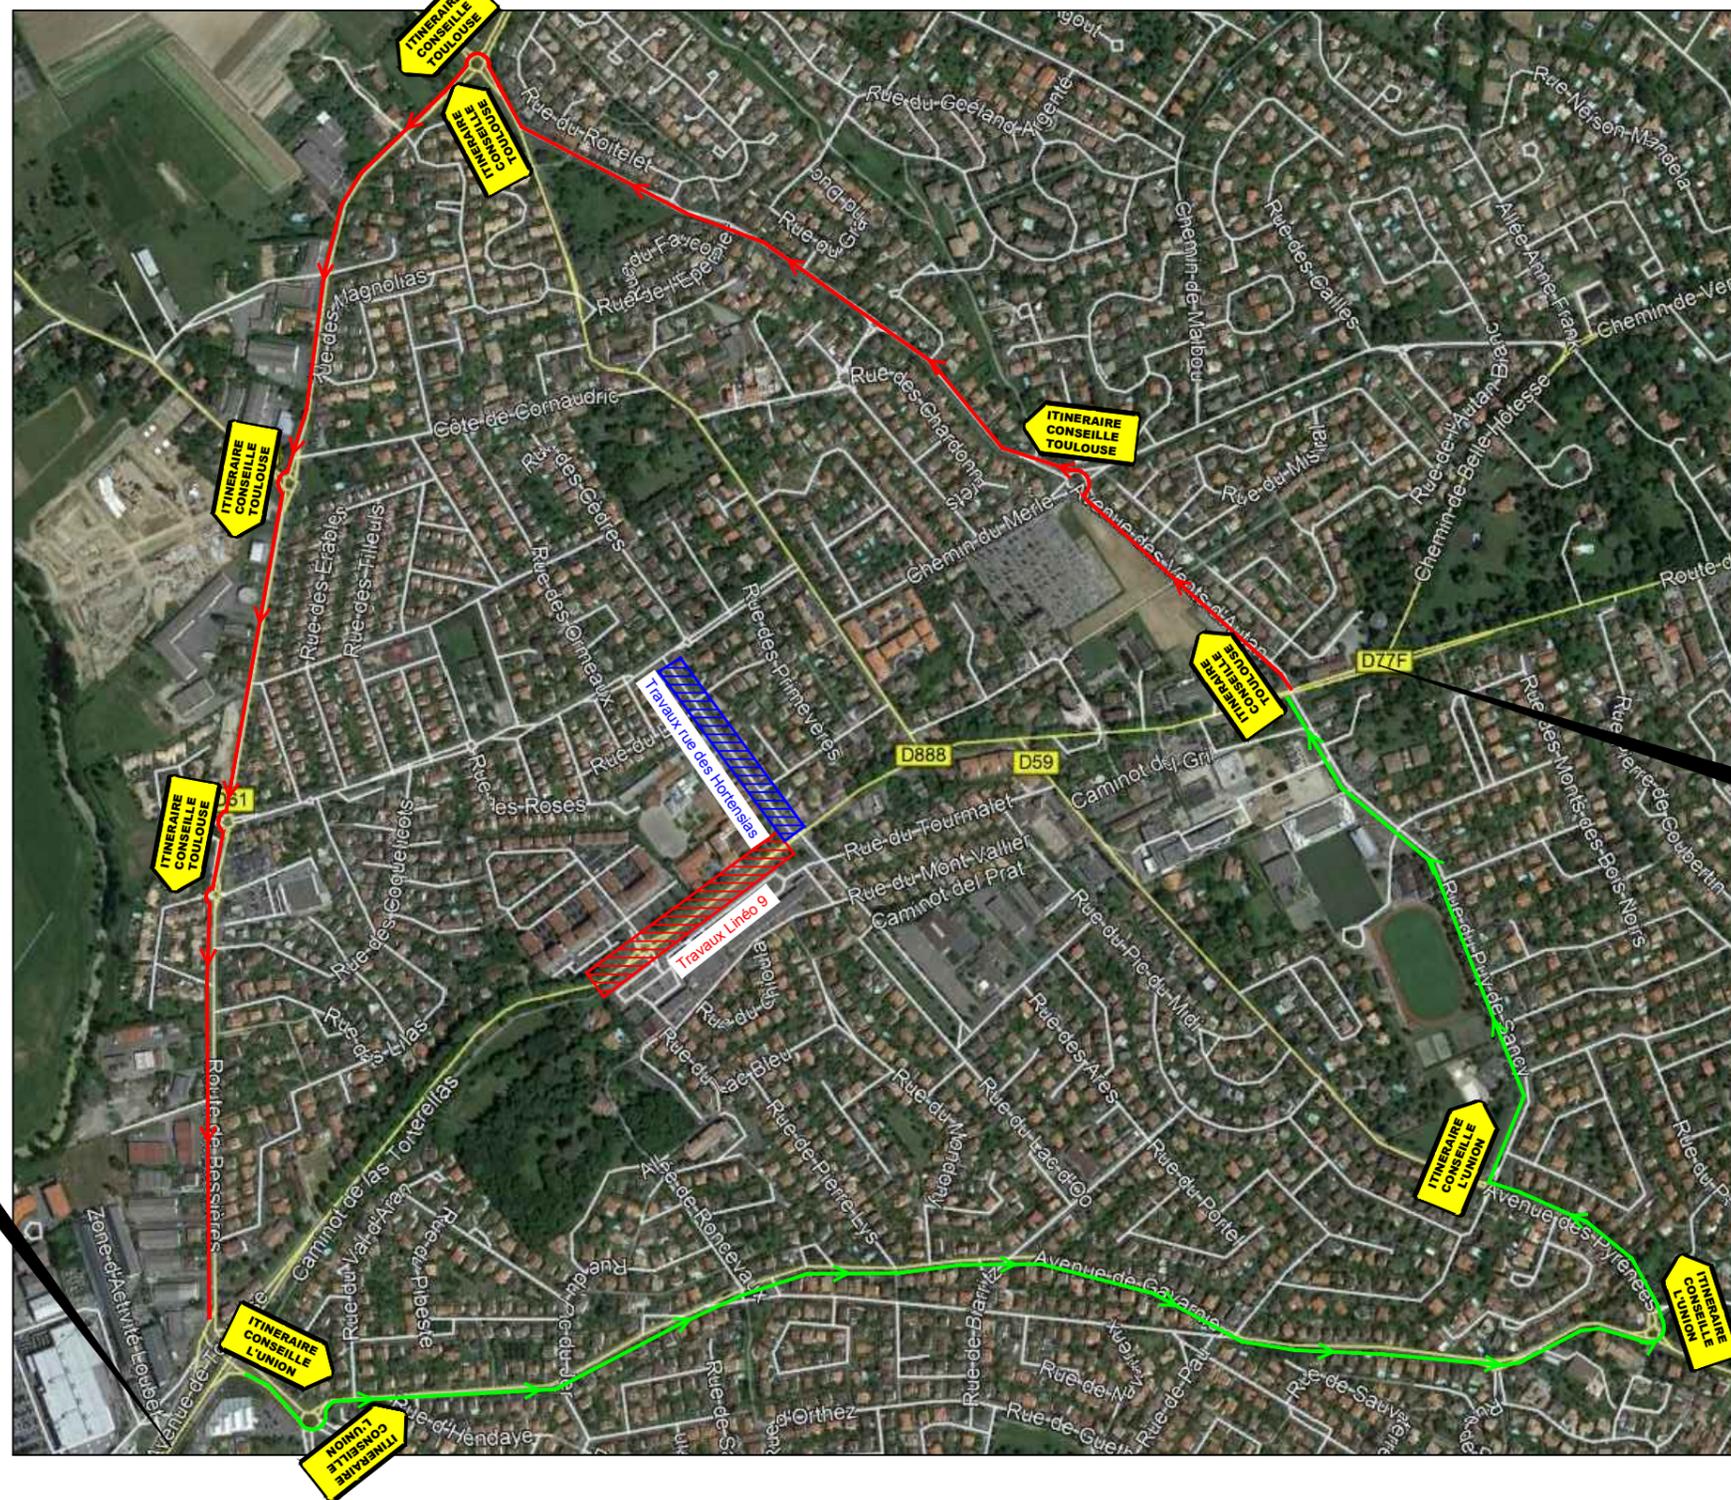

TRAVAUX AVENUE DE TOULOUSE
 L'UNION SUIVRE ITINERAIRE CONSEILLE

TRAVAUX AVENUE DE TOULOUSE
 TOULOUSE SUIVRE ITINERAIRE CONSEILLE



- Sens de circulation, direction L'Union
- Sens de circulation, direction Toulouse

Date de création:	2 février 2018
Mise à jour:	--
Indice:	A
Planning de référence:	



Syndicat Mixte des Transports en Commun
de l'Agglomération Toulousaine

